

奄美地方における集中豪雨災害(土砂災害)

鹿児島県 土木部 砂防課
11/25 8:00現在


土砂災害58件発生。全壊6戸。半壊1戸。一部損壊8戸。死者1人。負傷者1人。

市町村別 被災状況

【被災自治体】	土砂災害発生件数		全戸戸数		半壊戸数		一部損壊戸数		死者		負傷者	
	発生数	発生率	総戸数	(%)	半壊	(%)	一部損壊	(%)	死者	(人)	負傷者	(人)
奄美市	31	16	2	0	3	2	0					
龍郷町	15	15	2	3	2							
大和村	8	8	1	2								
宇検村	5	5										
瀬戸内町	12	12	3	1	1	1						
喜界町	2	2										
徳之島町												
伊仙町												
和泊町												
龍郷町												
計	58	58	6	1	5	3	1					

土砂災害発生件数 58件


- 土石流等: 20件
- 地すべり: 4件
- ▲ がけ崩れ: 34件

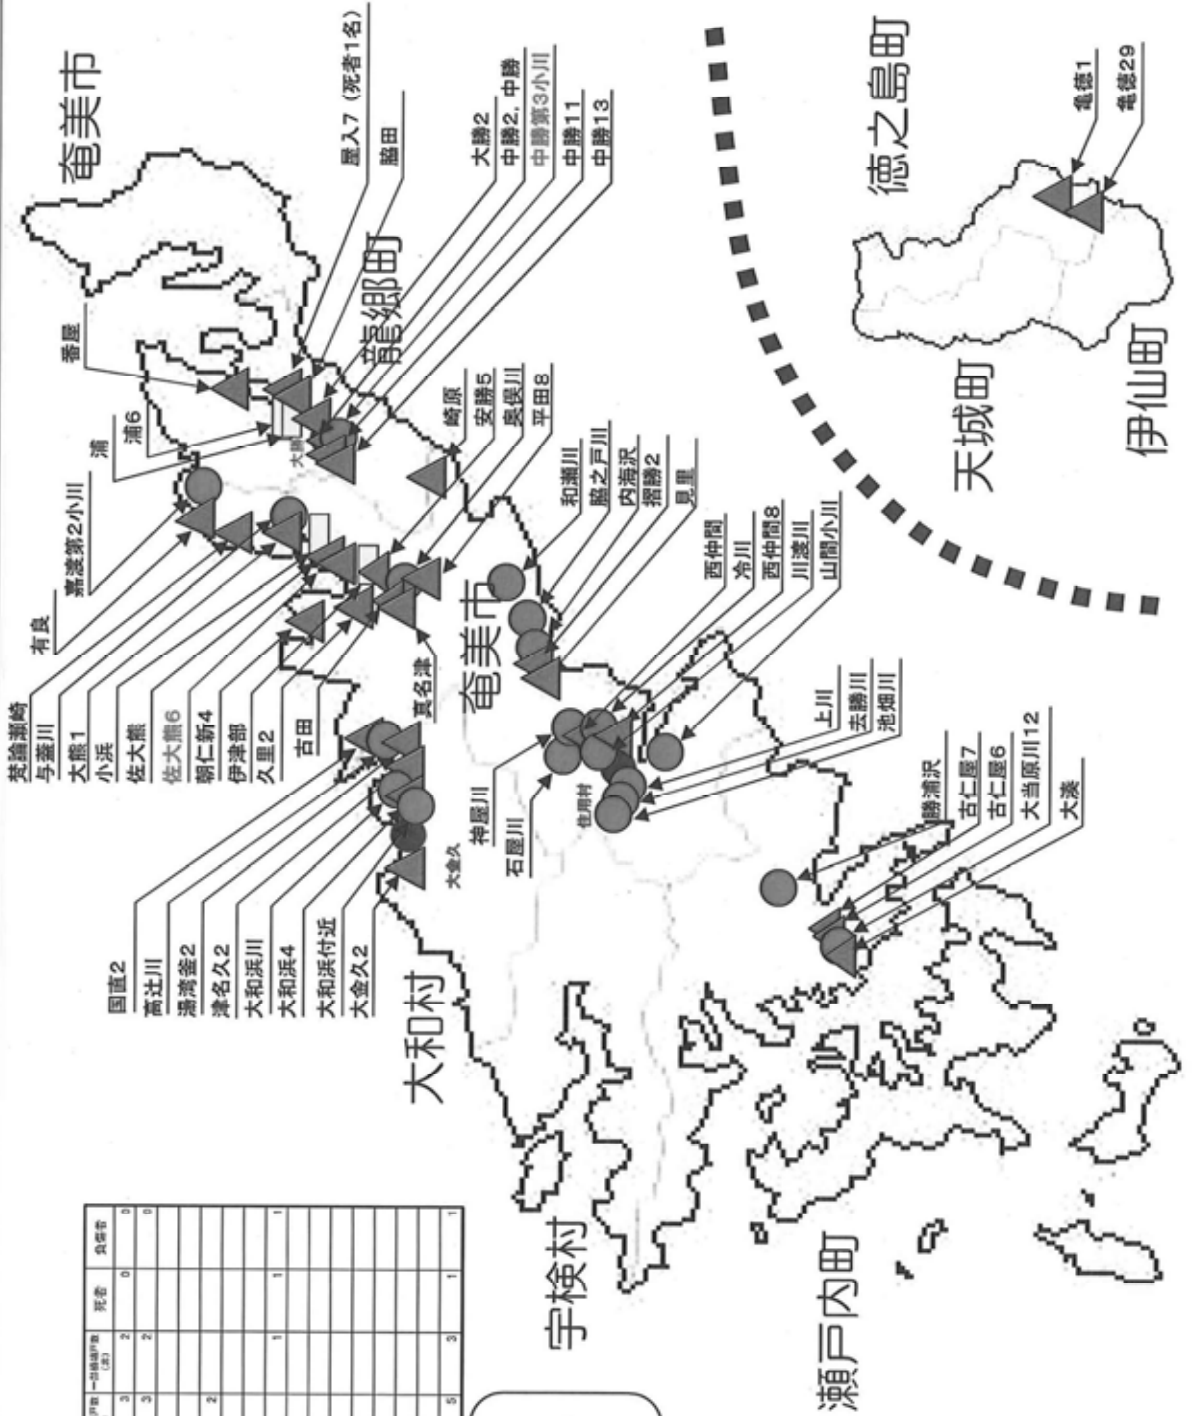

22年災害復旧状況

箇所名 : 大島郡龍郷町浦
被害内容 : 地すべり

位置図

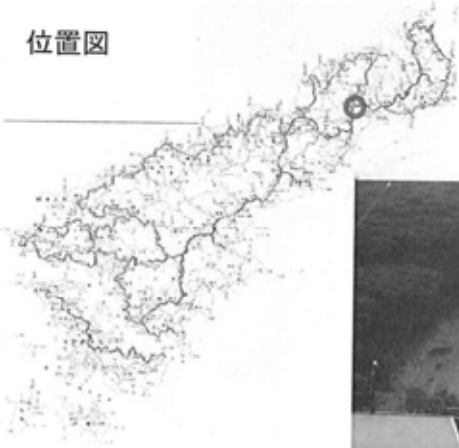

被災状況



2010/10/21 撮影

現況



2012/1/5撮影

奄美豪雨災害後の復旧状況等について

平成24年1月6日現在

1. 道路・河川災害復旧事業（22災）

工種	箇所数	発注状況		完成	
		箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
河川	48	48	100%	45	94%
海岸	3	3	100%	2	67%
道路	45	45	100%	39	87%
計	96	96	100%	86	90%

2. 河川における土砂除去対策（県単独事業）

工種	箇所数	発注状況		完成	
		箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
寄洲除去 (H22)	16	16	100%	16	100%
寄洲除去 (H23)	6	6	100%	6	100%
計	22	22	100%	22	100%

3. 河川の氾濫防止対策

7河川の抜本対策については、国及び市町村と協議中。

また、大美川や戸口川等については、災害対策等緊急事業推進費等として190百万円の予算内示があり、河道掘削等を緊急に行う予定。

4. 道路の地すべり災害復旧事業（23災）

工種	路線名	場 所	発注済
道 路	国道58号	奄美市名瀬平田地内	○
	国道58号	大島郡龍郷町中勝地内	○
			2箇所(100%)

5. 土砂災害箇所の災害関連・激特事業（採択箇所）

工種	事業名	地区数	発注	発注率	備 考
砂 防	災害関連	5	5	100%	
	激特事業	7	7	100%	調査・設計
地すべり	災害関連	1	1	100%	
	激特事業	1	0	0%	2月発注予定
急傾斜	災害関連	3	3	100%	
	激特事業	0	0	—	
合 計	災害関連	9	9	100%	
	激特事業	8	7	88%	

農業・林業関係

22年災害復旧状況

事業名 : 平成22年度災害関連緊急治山事業
箇所名 : 奄美市住用町摺勝登ノ小屋地内


位置図



被災状況



完 成 (平成23年8月17日)

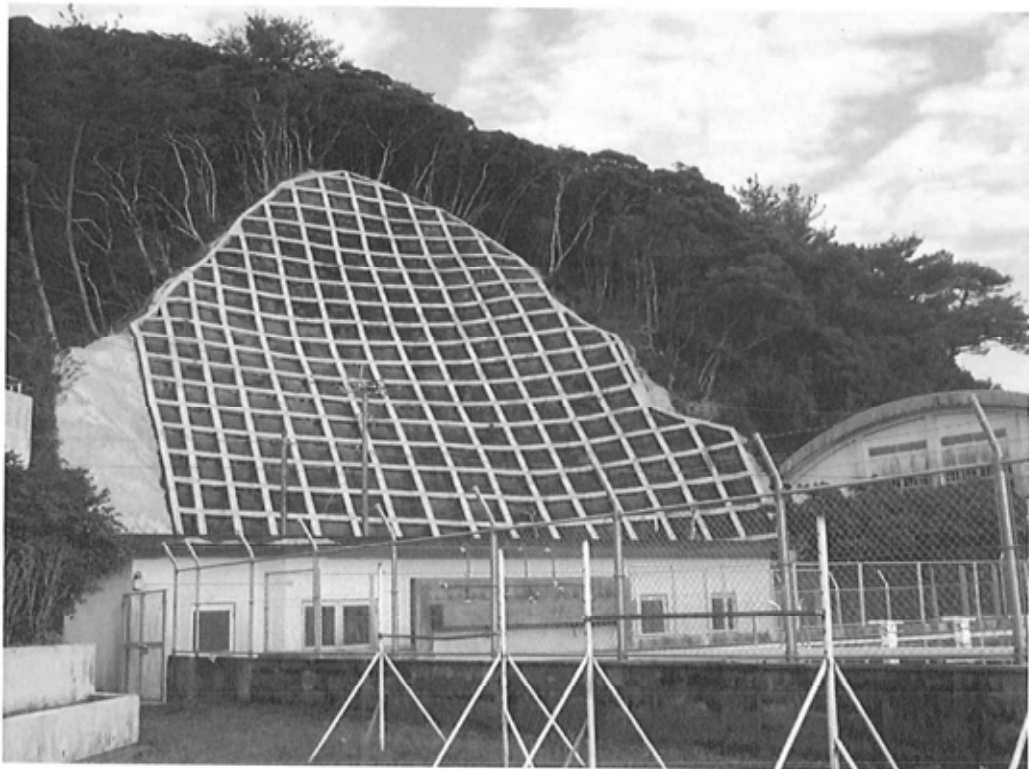

奄美豪雨災害後の復旧状況等について

24.1.6 現在

1 農業関係

県単独事業（農業・農村活性化推進施設等整備事業（知事特認））により，被害を受けた野菜，果樹の播き直しや改植のための種苗導入，樹園地への土壌改良資材の導入などに対する支援を実施。

作目	受益面積 (ha)	受益戸数 (戸)	対象作物	事業費 (円)
野菜	10.9	53	かぼちゃ	5,277
果樹	59.9	214	たんかん，すもも	10,610
計	70.8	267	—	15,887

2 農地・農業用施設関係

	地区数	事業費(千円)	発注状況		完成	
			地区数	進捗率	地区数	進捗率
農地	30	64,458	30	100%	30	100%
農業用施設(農道, 水路)	42	455,585	41	98%	33	80%
関連(龍郷町瀬留地区)	1	99,612	1	100%	0	0%
計	73	619,655	72	99%	63	88%

注) 農業用施設の未発注1地区については，近接工区との調整終了後に発注となるが，これを含めて全て23年度内完成予定。

3 治山・林道関係

	地区数	事業費(千円)	発注状況		完成	
			地区数	進捗率	地区数	進捗率
治山	21	491,800	17	81%	12	71%
林道	58	824,850	58	100%	46	79%
計	79	1,316,650	75	95%	58	77%

注)

- 1 治山関係の災害復旧については，平成24年度末で完成予定。
- 2 林道関係の復旧については，平成23年度末までに完成予定。

保健福祉関係
