

1. 鉄道輸送の復旧状況（別紙1参照）

2. 東日本大震災を踏まえ検証・検討を行っている事項

（1）新幹線等の地震対策

- ① 大震災による新幹線の構造物等の被害や回送列車の脱輪を踏まえ、耐震補強など、これまでの地震対策を検証し、必要に応じ改善を図る。（第1回、5月13日開催）
- ② 新幹線及び在来線の鉄道構造物の耐震基準について、地震工学、地盤工学などの専門家を交え検証を行う。（第1回、5月27日開催）

（2）津波発生時における鉄道旅客の安全確保

津波発生時の鉄道旅客の避難誘導など安全確保の状況を検証し、課題の抽出と対応策を検討する。（第1回、4月27日開催、第2回、5月30日開催）

（3）首都圏等の地下鉄道の浸水対策

仙台空港線の地下トンネル等の浸水被害を踏まえ、大都市圏等の地下鉄道について、現行の浸水対策を検証し、必要に応じ改善を図る。（第1回、5月20日開催）

（4）大規模地震発生時等の首都圏鉄道の運転再開、利用者への情報提供

首都圏の鉄道の運行再開状況と利用者への情報提供状況などを検証し、課題の抽出と対応策を検討する。（第1回、4月20日開催、第2回、5月31日開催予定）

（5）沿岸部の鉄道の復旧・復興

まちづくりとの円滑な連携を推進するため、本省及び現地（線区別）にて、鉄道局、都市・地域整備局、JR東日本、地方自治体等が参加する連絡・調整等を行う場を設置する。JR仙石線について、5月23日に現地調整会議を開催（別紙2）。JR常磐線について、6月2日に現地調整会議開催予定（別紙3）。他の線区についても順次開催予定。

東北地方の主な鉄道路線の運行及び休止状況

(5月30日 13時30分現在判明分)

凡例

■ : 運転中

■ : 運転再開予定の路線

- ① ひたちなか海浜鉄道 中根～那珂湊 6月25日
同区間を含む勝田～(中根～那珂湊)～平磯は7月中旬
- ② 鹿島臨海鉄道 新鉾田～大洋 7月中旬頃目標
- ③ 仙石線 矢本～石巻 7月末
- ④ ひたちなか海浜鉄道 平磯～阿字ヶ浦 7月末

仙台都市圏

- ⑤ 仙台空港線 名取～美田園 7月下旬
- ⑥ 仙台空港線 美田園～仙台空港 9月末目標

■ : 路線の復旧にあたり、まちづくりとの連携等の検討が必要となる区間が含まれる路線


- 八戸線 階上～久慈
- 山田線 宮古～釜石
- 大船渡線 盛～気仙沼
- 気仙沼線 気仙沼～柳津
- 石巻線 女川～石巻
- 仙石線 矢本～高城町
- 常磐線 巨理～久ノ浜

■ : その他の運休中の路線
三陸鉄道北リアス線 陸中野田～小本
三陸鉄道南リアス線 釜石～盛

- ※ 運休中の貨物鉄道路線
- (A) 八戸臨海鉄道
 - (B) 岩手開発鉄道
 - (C) JR貨物(石巻港線)
 - (D) 仙台臨海鉄道
 - (E) 福島臨海鉄道
- 泉～宮下 5月30日運転再開
宮下～小名浜 運休中
- (F) 鹿島臨海鉄道(鹿島臨港線)
鹿島サッカースタジアム～神栖
5月25日運転再開
神栖～奥野谷浜
6月上旬運転再開予定



JR仙石線、石巻線の復旧状況について (平成23年5月30日現在)

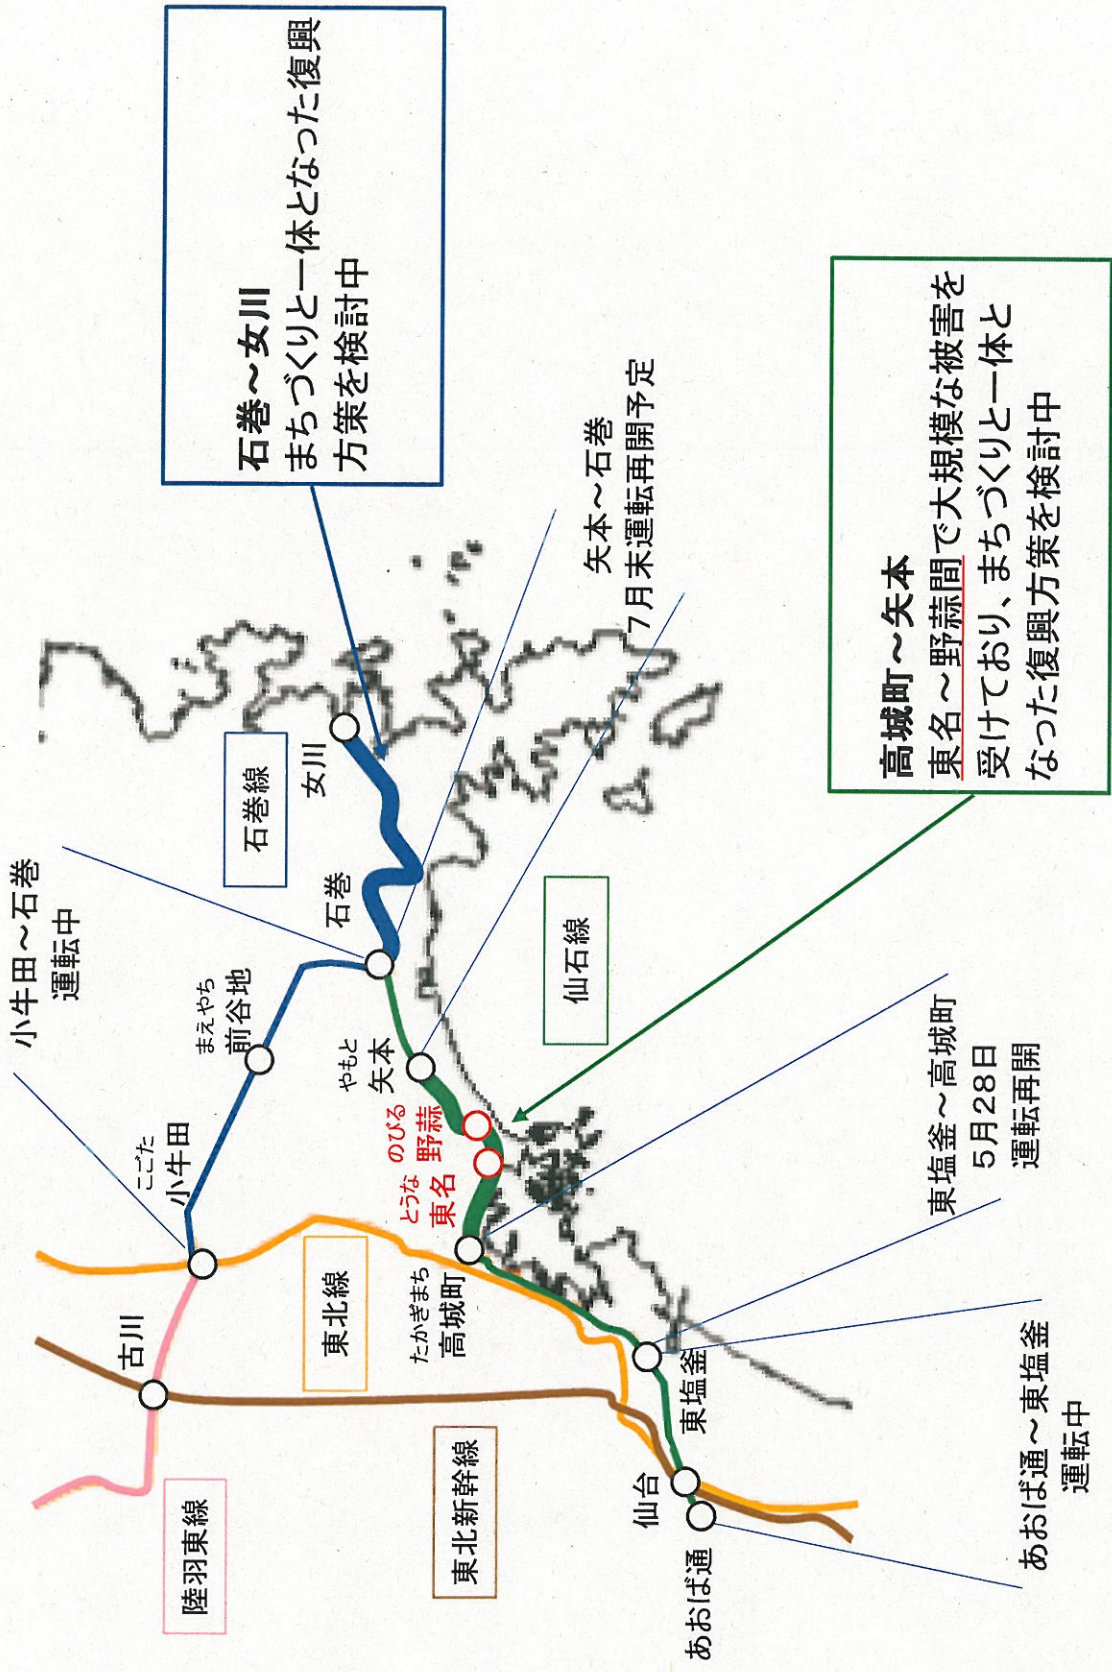

JR常磐線北部地域の復旧状況について

(平成23年5月30日現在)

