

建設工事に係る最近の重大事件事例

新名神高速道路における工事事故①

発生日時：平成28年4月22日(金)16:30頃

※ NEXCO西日本(株)報道発表資料より引用


場所：新名神高速道路 有馬川橋(上り線) ※建設中区分
 → 上り線のA2橋台～P11橋脚の桁(約120m、約1350t)が落下

国道の状況：国道176号が通行止め

工事県名：新名神高速道路 有馬川橋(鋼・PC複合上部工)工事

施工会社：三井住友建設株式会社、株式会社横河ブリッジ


工期：平成25年5月30日～平成29年2月17日

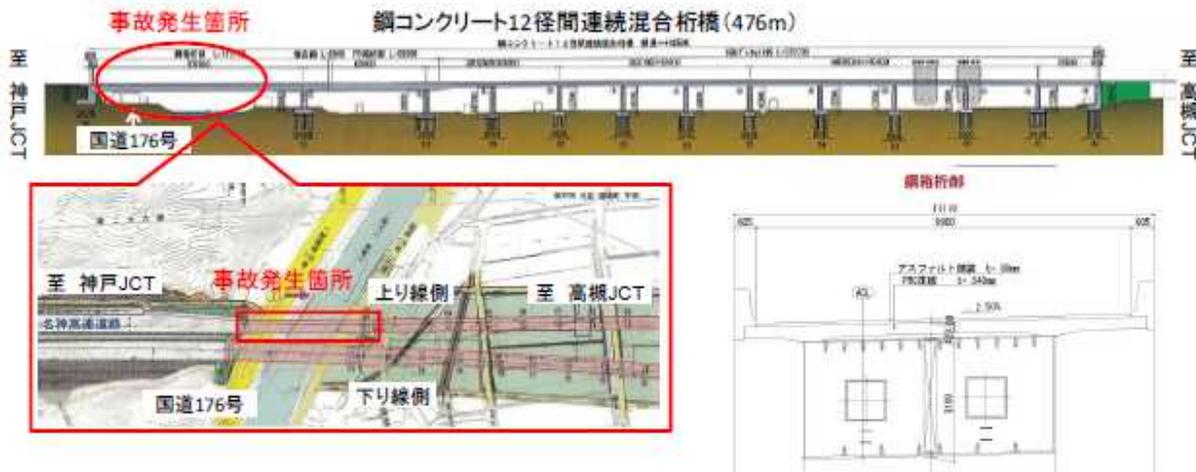

(位置図)



(事故概要)

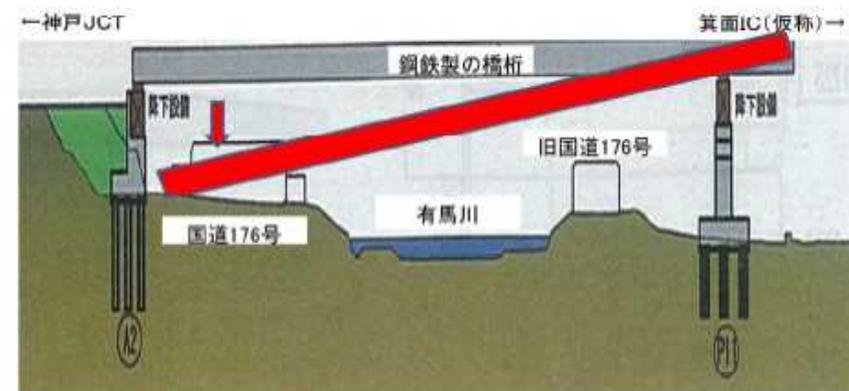

(事故状況写真) 落下桁



仮設備



仮設備

落下桁 下り線の桁



仮設備

新名神高速道路における工事事故②

発生日時：平成28年5月19日(木)9:55頃

※ NEXCO西日本(株)報道発表資料より引用

場所：新名神高速道路 余野川橋(下り線) ※建設中(大阪府箕面市下止々呂美)

→ 仮受設備(ベント)※が桁下を通過する箕面有料道路上に転倒

※概略寸法(高さ13m、幅7m、奥行き2m)、重さ約21t

被害の状況：負傷者なし

交通の状況：桁下を通過する箕面有料道路が南行、北行ともに通行止め

工事県名：新名神高速道路 余野川橋他1橋(鋼上部工)工事

施工会社：株式会社IHIインフラシステム

工期：平成25年1月30日～平成29年1月8日

橋梁概要：余野川橋(下り線) 延長316m、鋼5径間連続合成少数鈹桁橋

平面図




事故状況写真



転倒した仮受設備(ベント)



転倒した仮受設備(ベント)

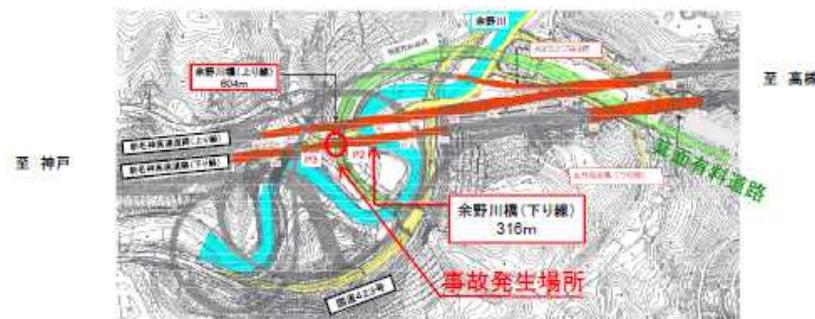

事故概要図

