

- 国管理の子吉川水系子吉川、石沢川（秋田県由利本荘市）、最上川水系最上川（山形県新庄市、戸沢村）、鮭川（山形県戸沢村）の2水系4河川、4県（岩手県、秋田県、山形県、宮城県）管理の10水系31河川で浸水被害が発生（概ね浸水解消済み）。
- このうち、子吉川水系子吉川、石沢川、最上川水系最上川、新田川、野尻川、米代川水系五反沢川の計14箇所（国3箇所、秋田県6箇所、山形県5箇所）で堤防の決壊や欠損を確認。緊急応急復旧工事については、準備が整い、水位が低下し安全が確認されたところから順次着手。国管理の子吉川水系子吉川、石沢川では、水防活動等のための基準水位を引き下げて運用中。
- 排水機場3箇所（山形県酒田市、戸沢村）でポンプ設備の故障が発生（背後地の浸水解消済み）。施設復旧までの代替として、排水ポンプ車を配備済み。
- 61ダムで洪水調節（事前放流を含む）を実施。このうち、32ダムは事前放流の基準に達し、容量を確保（利水ダムは25ダム）。
- 1ダムで緊急放流（非常用洪水吐きからの越流）に移行。1ダムで特別防災操作（通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する操作）を実施。
- 最上川水系の直轄2ダム（白川ダム、寒河江ダム）で、今後の降雨に備えて利水容量から合計約240万m³を追加的に確保。そのほか、県管理ダム5ダム、利水ダム3ダムを含め、流域全体で約950万m³の空き容量を確保済み。

秋田県内における河川の状況

【浸水被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川） 概ね浸水解消



県管理河川（4水系7河川） 概ね浸水解消




【施設被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川）緊急応急復旧工実施中



県管理河川（2水系2河川） 緊急応急復旧工実施中

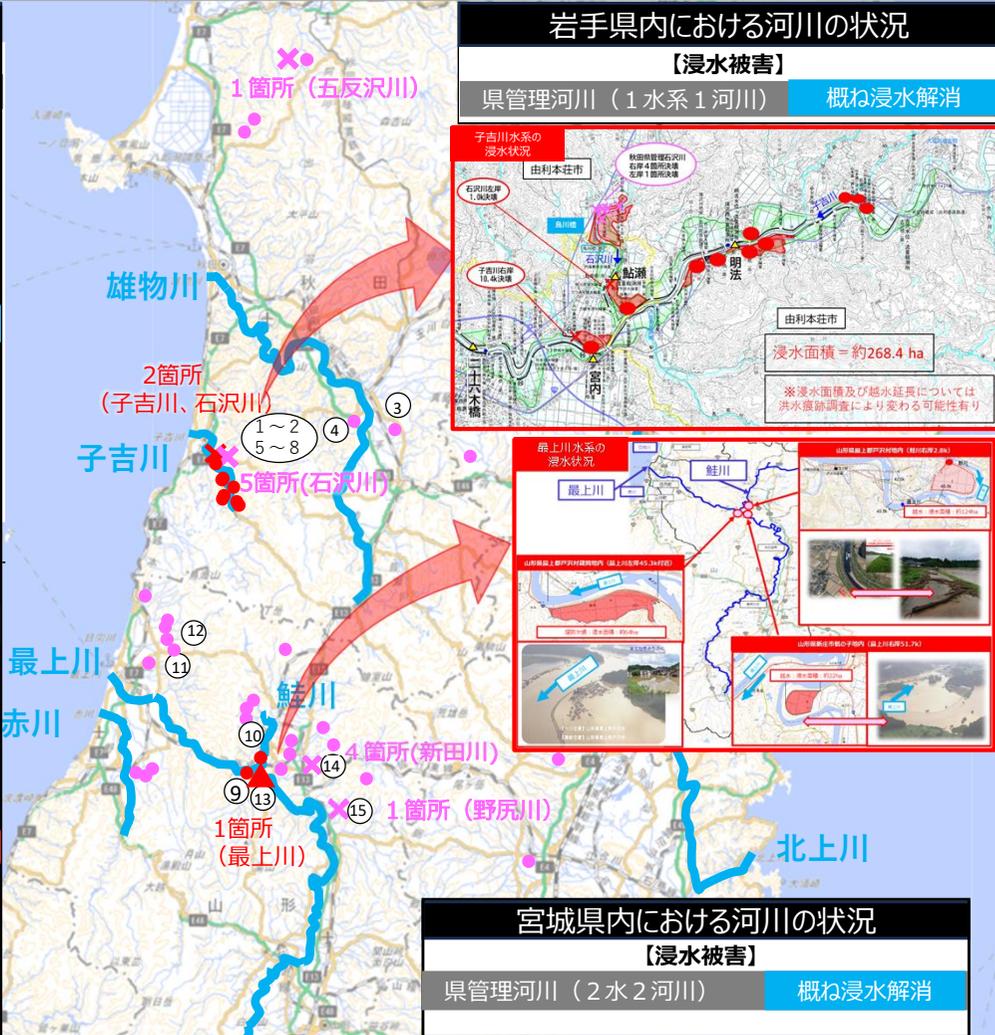

× : 氾濫(堤防決壊)(国) ▲ : 氾濫(堤防欠損)(国) ● : 氾濫(溢水・越水)(国)
× : 氾濫(堤防決壊)(県) ● : 氾濫(溢水・越水)(県)

子吉川水系 (秋田県由利本荘市) の堤防決壊箇所の緊急応急復旧工事について

- 子吉川水系子吉川、石沢川の堤防決壊箇所 (国2箇所、県5箇所) の緊急応急復旧工事を実施中。



7月25日 被災確認



7月25日 被災確認

国管理区間	
子吉川(本川)	
7月26日	大型土嚢の製作に着手
7月27日	仮設道路整備に着手 (29日完了)
7月29日	荒締切盛土(岩ズリ)施工に着手
石沢川(支川)	
7月26日	根固めブロック工に着手
7月27日	荒締切盛土(岩ズリ)施工 (28日完了)
7月29日	大型連結ブロックの設置に着手

緊急復旧断面(国施工)

7月29日15時撮影
子吉川(本川)
※荒締切盛土(岩ズリ)施工中

7月29日15時撮影
石沢川(支川)
法面整形、大型連結ブロック設置


秋田県管理区間	
※右岸側4箇所は仮設道路を整備中	
石沢川(支川)左岸側	
7月25日	大型土嚢製作に着手
7月26日	仮設道路整備に着手
7月28日	堤防決壊箇所の整地作業に着手
7月29日	堤防決壊箇所の大型土嚢設置に着手

応急対策内容(県施工)

7月29日16時撮影
左岸側堤防決壊箇所大型土嚢設置状況

最上川水系 (山形県最上郡戸沢村) の緊急応急復旧工事について

もがみがわ さけがわ
● 最上水系最上川の堤防欠損 (国管理区間/左岸45.3kp)、最上川水系鮭川の堤防亀裂 (国管理区間/右岸6.3kp) の緊急応急復旧工事を実施中。

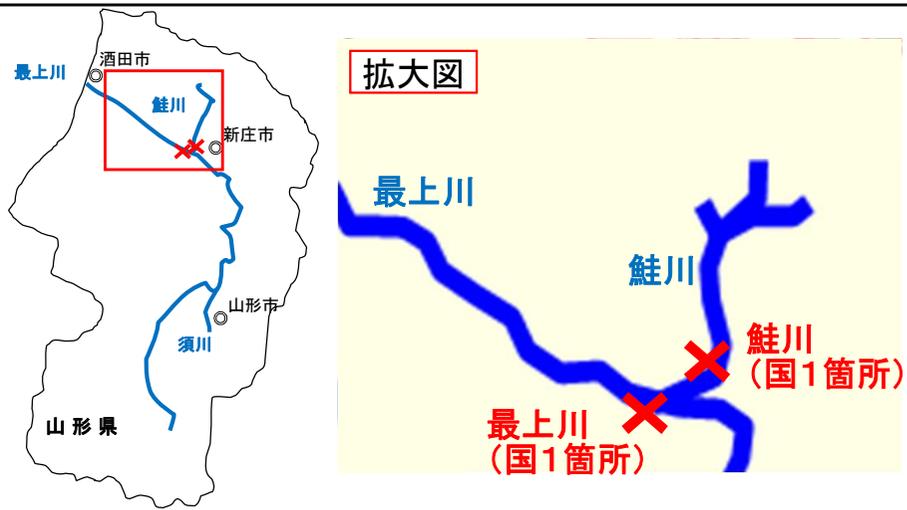

最上川(左岸45.3kp)
7月26日 被災確認
堤防欠損 L=100m



鮭川(右岸6.3kp)
7月25日 被災確認
堤防亀裂(裏法崩れ) L=70m


国管理区間

最上川(本川)


7月27日
堤防表法面と堤防裏法面欠損箇所にシート張りを施工、
堤防復旧に支障となる、既設構造物を撤去
7月29日 盛土工に着手

鮭川(支川)

7月27日
施工ヤード造成に着手
並行して大型連結ブロック現地搬入
7月28日 堤防表法面に大型連結ブロック設置
7月29日 川裏亀裂箇所盛土工に着手

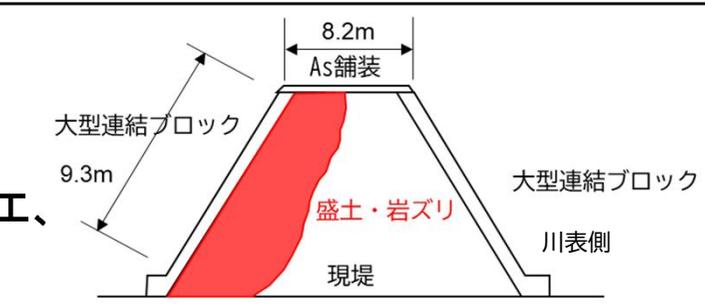


緊急復旧断面

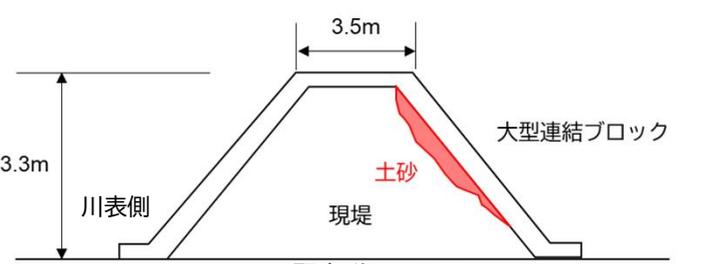

緊急復旧断面




■秋田県・山形県 位置図

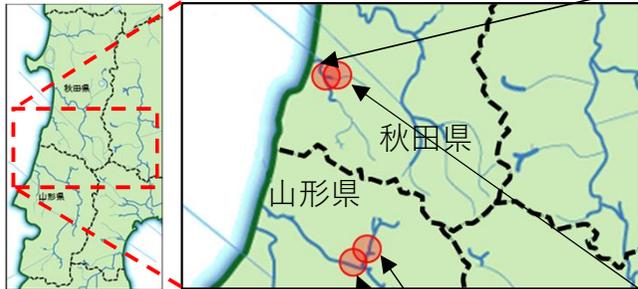

こよしがわ こよしがわ
子吉川水系子吉川
ゆりほんじょうし
(秋田県由利本荘市)
堤防決壊L=約70m
進捗率 20%




■子吉川水系堤防決壊箇所緊急復旧断面

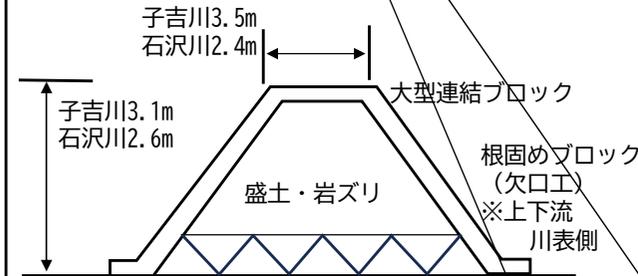

こよしがわ いしざわがわ
子吉川水系石沢川
ゆりほんじょうし
(秋田県由利本荘市)
堤防決壊L=約60m
進捗率 70%




■鮭川堤防亀裂(裏法崩れ)箇所緊急復旧断面

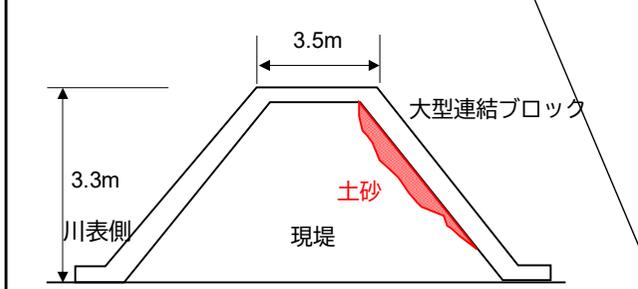

もがみがわ さけがわ
最上川水系鮭川
もがみぐんとざわむら
(山形県最上郡戸沢村)
堤防亀裂 (裏法崩れ)
L=約70m
進捗率 50%



■最上川堤防欠損箇所緊急復旧断面

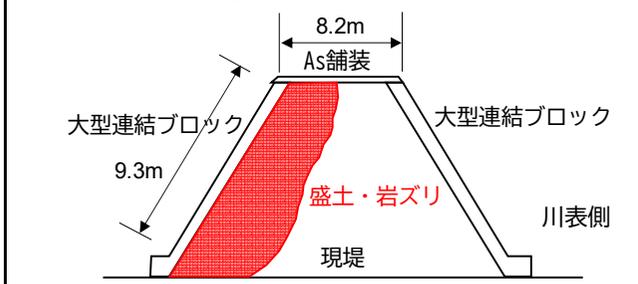

もがみがわ もがみがわ
最上川水系最上川
もがみぐんとざわむら
(山形県最上郡戸沢村)
堤防欠損L=約100m
進捗率 35%




【秋田県、山形県】水道施設の被害状況等について


令和6年7月30日
7:00時点

県	市町村・事業者名	断水戸数 (戸)		断水期間	被害状況	応急給水状況 応援要請	復旧対応状況	復旧見通し
		最大	現在					
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	126	126	7/26～	河川氾濫により水道管破損	実施中	復旧に向け河川部局と調整中	未定
	ゆりほんじょうし 由利本荘市	64	11	7/24～	土砂崩れによる水道管破損	実施中	仮復旧工事実施中	7/30
	よこてし 横手市	20	0	7/25～29	水道管破損 (継手外れ)	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
	にかほ市	3	0	7/24～29	河川増水による添架管破損	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
山形県	さげがわむら 鮭川村	1,132	1,132	7/26～	河川氾濫、土砂崩れによる水道管破損	実施中	仮復旧工事実施中	未定
	さかたし 酒田市	252	252	7/25～	橋梁落橋、道路崩落による水道管破損	実施中	復旧に向け道路部局と調整中	未定
		826	11	7/25～	河川増水による水管橋損傷 等	実施中	仮復旧方法を検討中	未定
	まむろがわまち 真室川町	380	0	7/25～28	水源地ポンプ設備冠水 土砂崩れによる水道管破損	実施中	仮復旧工事完了	7/28復旧済
	とざわむら 戸沢村	2	0	7/26～29	地すべりによる水道管損傷	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
合計		2,805	1,532					

●水道施設の被災状況等

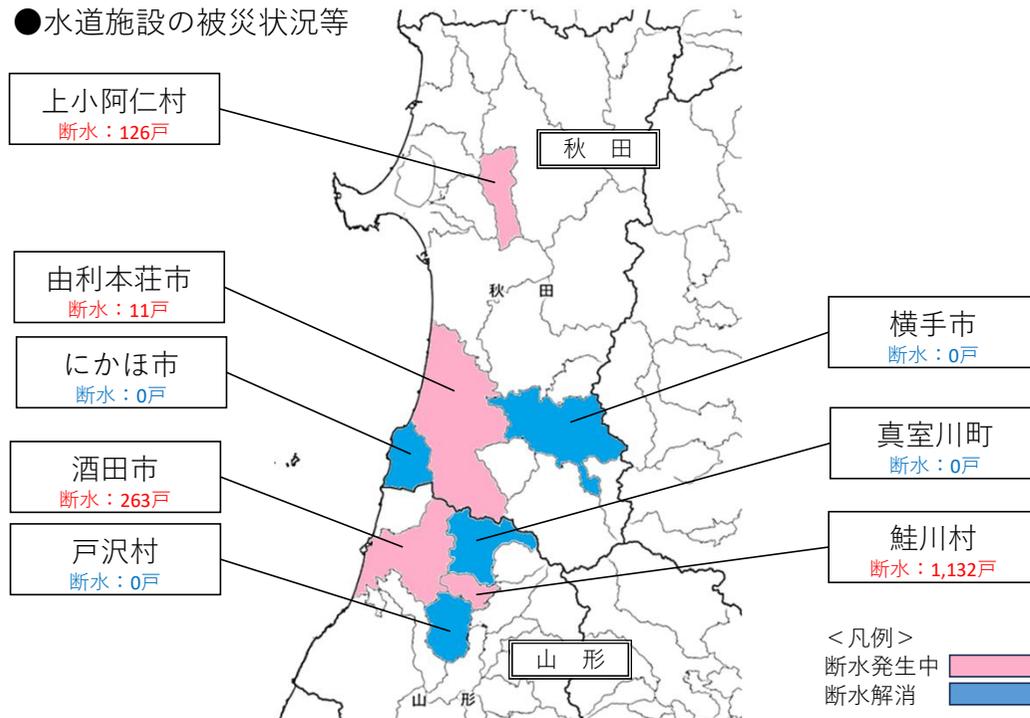

●被災状況等

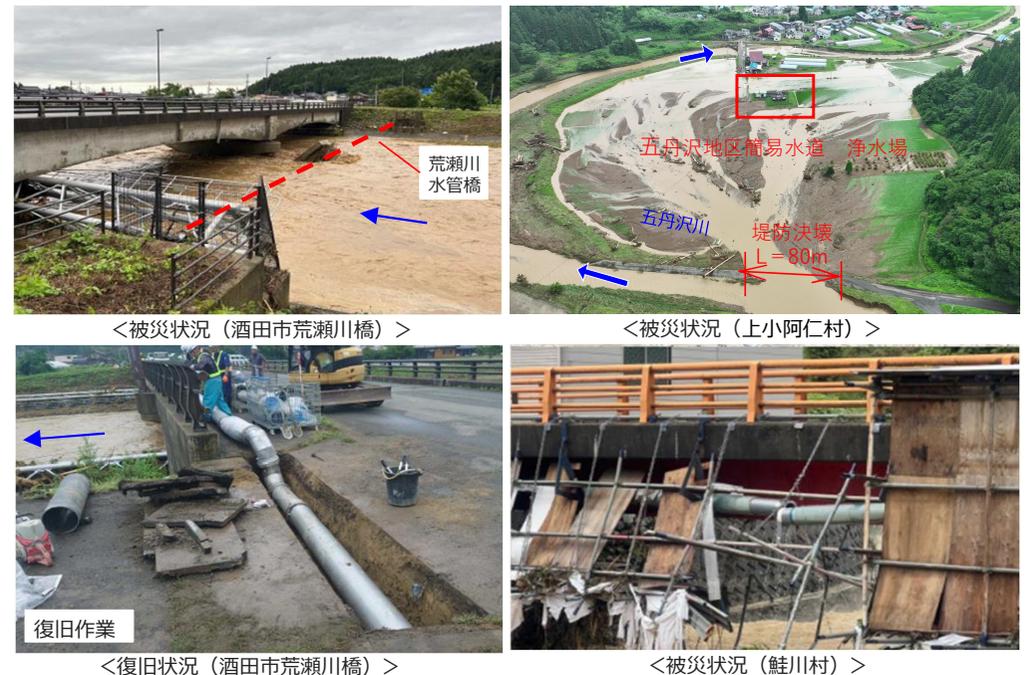

【秋田県、山形県】下水道施設の被害状況等について

●被害のあった下水道施設


県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	マンホールポンプ 1基	浸水により異常確認	点検実施により復旧済み
山形県	さかたし 酒田市	やはた 八幡浄化センター	浸水により機能停止	仮設ポンプの設置や簡易処理の実施により機能確保済み
		まつやま 松山浄化センター	浸水により機能停止	揚水機能の復旧や簡易処理の実施により機能確保済み
	とざわむら 戸沢村	ふるくち 古口浄化センター	浸水により機能停止	ポンプ操作盤の応急対応により機能確保済み

●被害のあった下水道施設の位置

<凡例>

下水処理場 : ▲

マンホールポンプ : ●

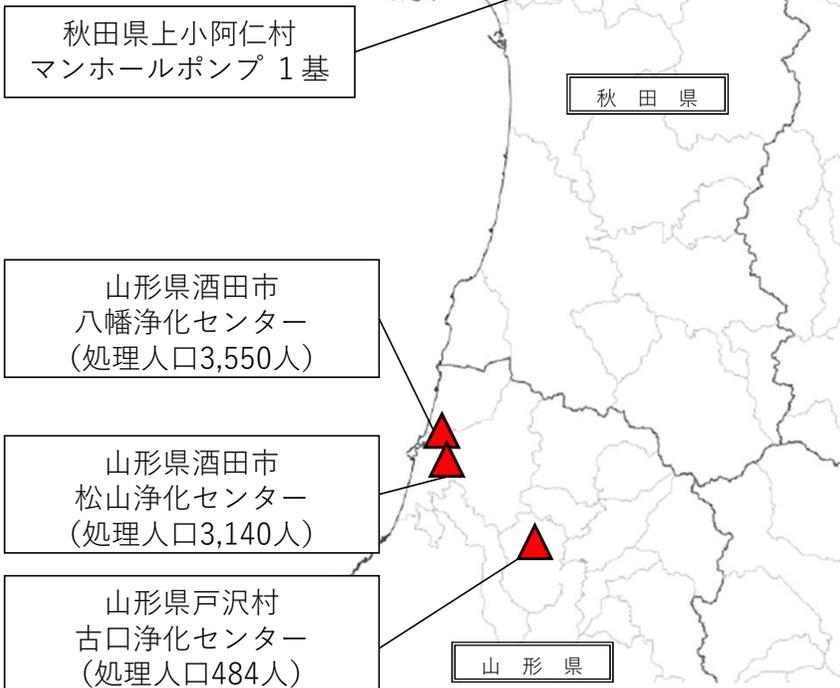

●山形県酒田市八幡浄化センターの被災状況と応急対応状況



浸水した曝気ブロー

●山形県酒田市松山浄化センターの被災状況と応急復旧状況



浸水した浄化センター内



揚水機能の復旧確認

7月25日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

25件

土石流等： 3件
 がけ崩れ： 22件

【被害状況】

※山形県、滋賀県は人家被害確認中
 人的被害： 負傷者 1名
 人家被害： 一部損壊 1戸

7/26 土石流等
 もがみぐんとざわむらまつざか
 山形県最上郡戸沢村松坂



7/26 がけ崩れ
 さかたし きたまた
 山形県酒田市北俣




7/26 がけ崩れ
 もがみぐんふながたまちふながた
 山形県最上郡舟形町舟形



7/29 がけ崩れ
 さつぼろし とよひらくにしおか
 北海道札幌市豊平区西岡



発生件数内訳	
山形県	17件
秋田県	4件
岩手県	2件
北海道	1件
滋賀県	1件

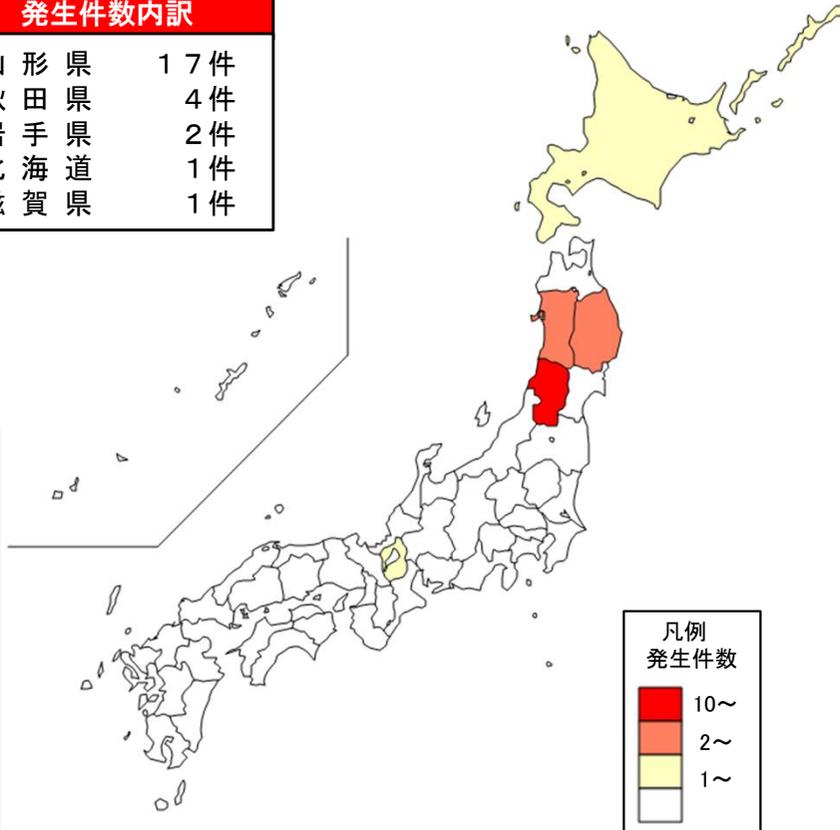

7/26 がけ崩れ
 よこてし ますだまちおきのふくろ
 秋田県横手市増田町荻袋



7/25 土石流等
 まいぼらし いぶき
 滋賀県米原市伊吹



7/26 がけ崩れ
 いちのせきし ましば
 岩手県一関市真柴



令和6年7月25日からの大雨による被災状況（道路）

240730_0600時点
国土交通省 道路局

※高速道路、直轄国道、補助国道の被災箇所

- 【凡例】
- 被災:
 - 被災+孤立:
 - 完了:



被災による通行止め区間 240730_0600 時点

路線	高速道路	直轄国道	補助国道	都道府県道	備考
秋田県	1路線 1区間	なし	3路線 3区間	9区間	孤立 解消
山形県	1路線 1区間	2路線 5区間	1路線 2区間	28区間	孤立 解消

注記)
 ・通行止め箇所は、補助国道以上を示している。
 ・地方道は、孤立箇所の発生要因となっている箇所のみ図示。

7月25日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

○施設被害により、山形新幹線を含め、秋田・山形・岩手県内の2事業者4路線で運転見合わせ中

秋田内陸縦貫鉄道 秋田内陸線 (被災6箇所)
運休(7/25~): 鷹巣駅~比立内駅間
運転再開時期

- ・鷹巣駅~阿仁合駅間: 8月4日
- ・阿仁合駅~比立内駅間: 8月中旬頃

土砂流入等



※写真は秋田内陸縦貫鉄道提供

JR東日本 大船渡線 (被災箇所 調査中)
運休(7/26~): 一ノ関駅~気仙沼駅間
運転再開時期: 未定

土砂流出



※写真はJR東日本提供

JR東日本 陸羽東線 (被災箇所 調査中)
運休(7/25~): 鳴子温泉駅~新庄駅間
運転再開時期: 未定

- : 運休区間
- : 再開区間
- ✖ : 写真の被害箇所
- × : 他の被害箇所

運転見合わせ路線
【新幹線: 1事業者1路線】
・JR東日本
山形新幹線(奥羽線)
山形駅~新庄駅間
【在来線: 2事業者4路線】
・JR東日本
奥羽線 村山駅~院内駅間
陸羽東線 鳴子温泉駅~新庄駅間
大船渡線 一ノ関駅~気仙沼駅間
・秋田内陸縦貫鉄道
秋田内陸線 鷹巣駅~比立内駅間

JR東日本 奥羽線 (被災箇所 調査中)
運休(7/25~): 村山駅~院内駅間
運転再開時期
・村山駅~大石田駅間: 8月1日
・大石田駅~新庄駅間: 8月中旬頃
・新庄駅~院内駅間: 未定


土砂流出・電柱倒壊等



芦沢駅~舟形駅間

※写真はJR東日本提供

※奥羽線に乗り入れている山形新幹線は山形駅~新庄駅間で運転見合わせ中
運転再開時期
・山形駅~大石田駅間: 8月1日
・大石田駅~新庄駅間: 8月中旬頃
代行輸送: 大石田駅~新庄駅間: 8月1日

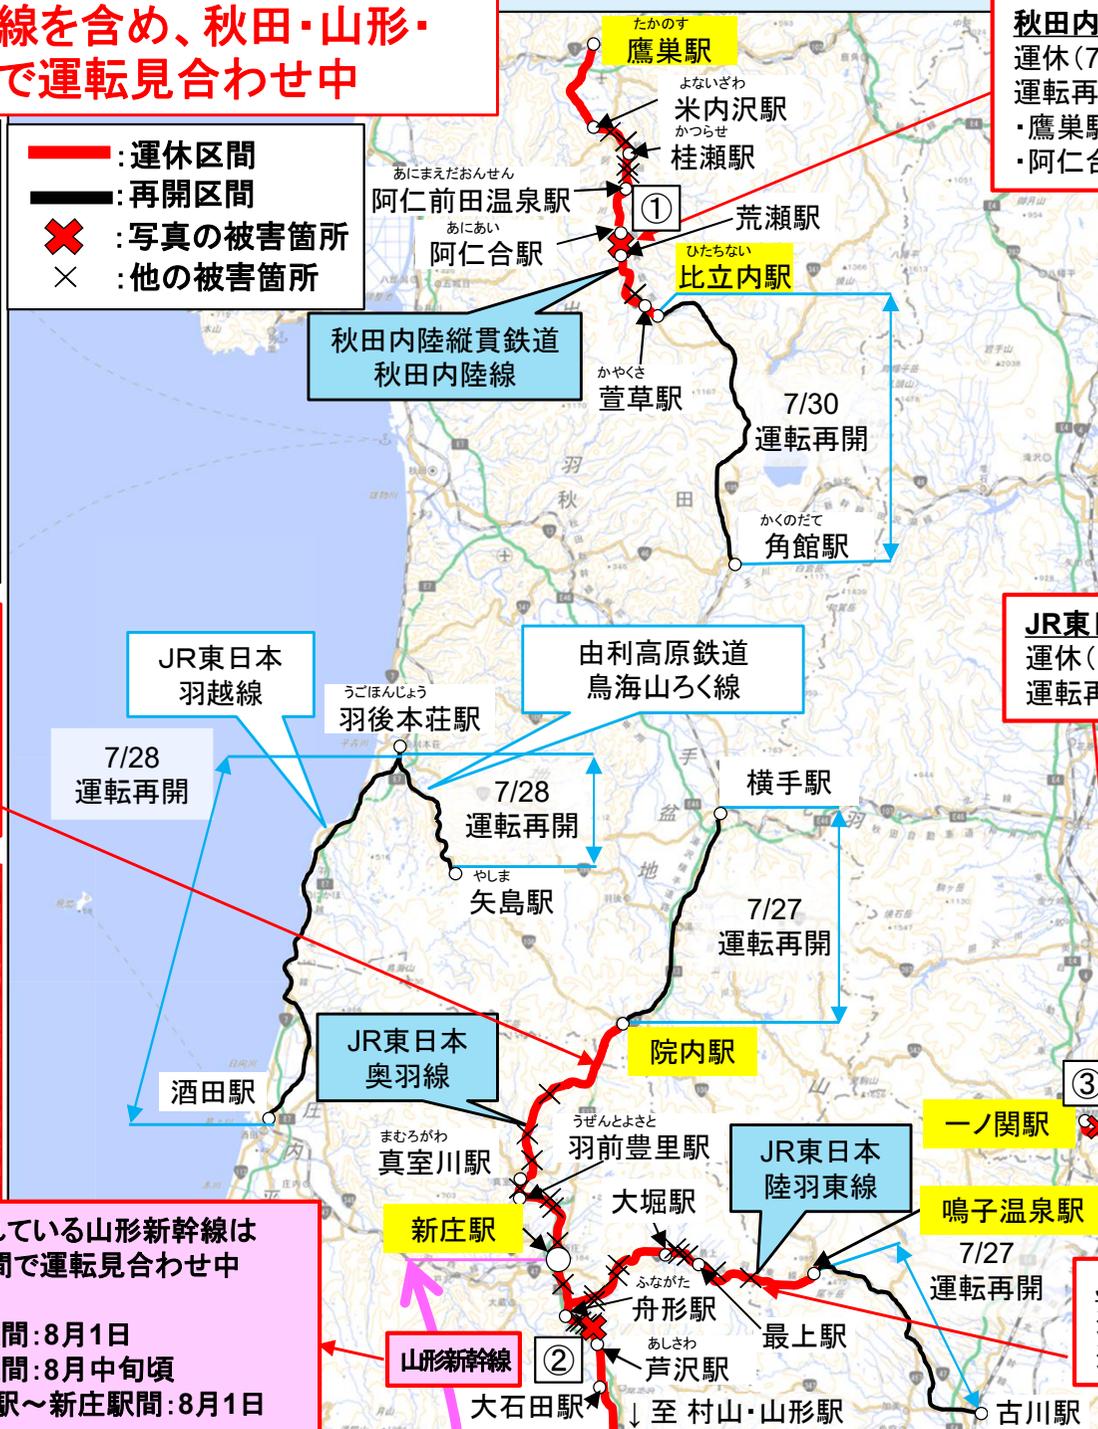

【施設名】仁賀保墓園（秋田県にかほ市）
【被害状況】法面の小崩落※人的被害無し
【対応状況】立入禁止措置済



法面小崩落(仁賀保墓園)



法面小崩落(仁賀保墓園)

にかほ
仁賀保墓園

【施設名】八幡公園（山形県新庄市）
【被害状況】土砂流出※人的被害無し
【対応状況】確認中

【施設名】新田川河川公園（山形県新庄市）
【被害状況】土砂堆積※人的被害無し
【対応状況】確認中

はちまん
八幡公園

にった
新田川河川公園

しもがわら
下川原公園

【施設名】最上川寒河江緑地（寒河江市）
【被害状況】土砂堆積※人的被害無し
【対応状況】使用禁止措置

【施設名】下川原公園（大石田町）
【被害状況】一部冠水※人的被害無し
【対応状況】使用禁止措置

もがみがわさがえ
最上川寒河江緑地




災害対策車稼働状況等位置図(秋田、湯沢、能代)

令和6年7月30日6時30分現在

青字は自治体支援

- ・内水排除箇所 0箇所
(自治体支援箇所 0箇所)
- ・排水ポンプ車 4台
- ・照明車 4台
- ・待機支援車 1台

活動中	撤収
待機中	

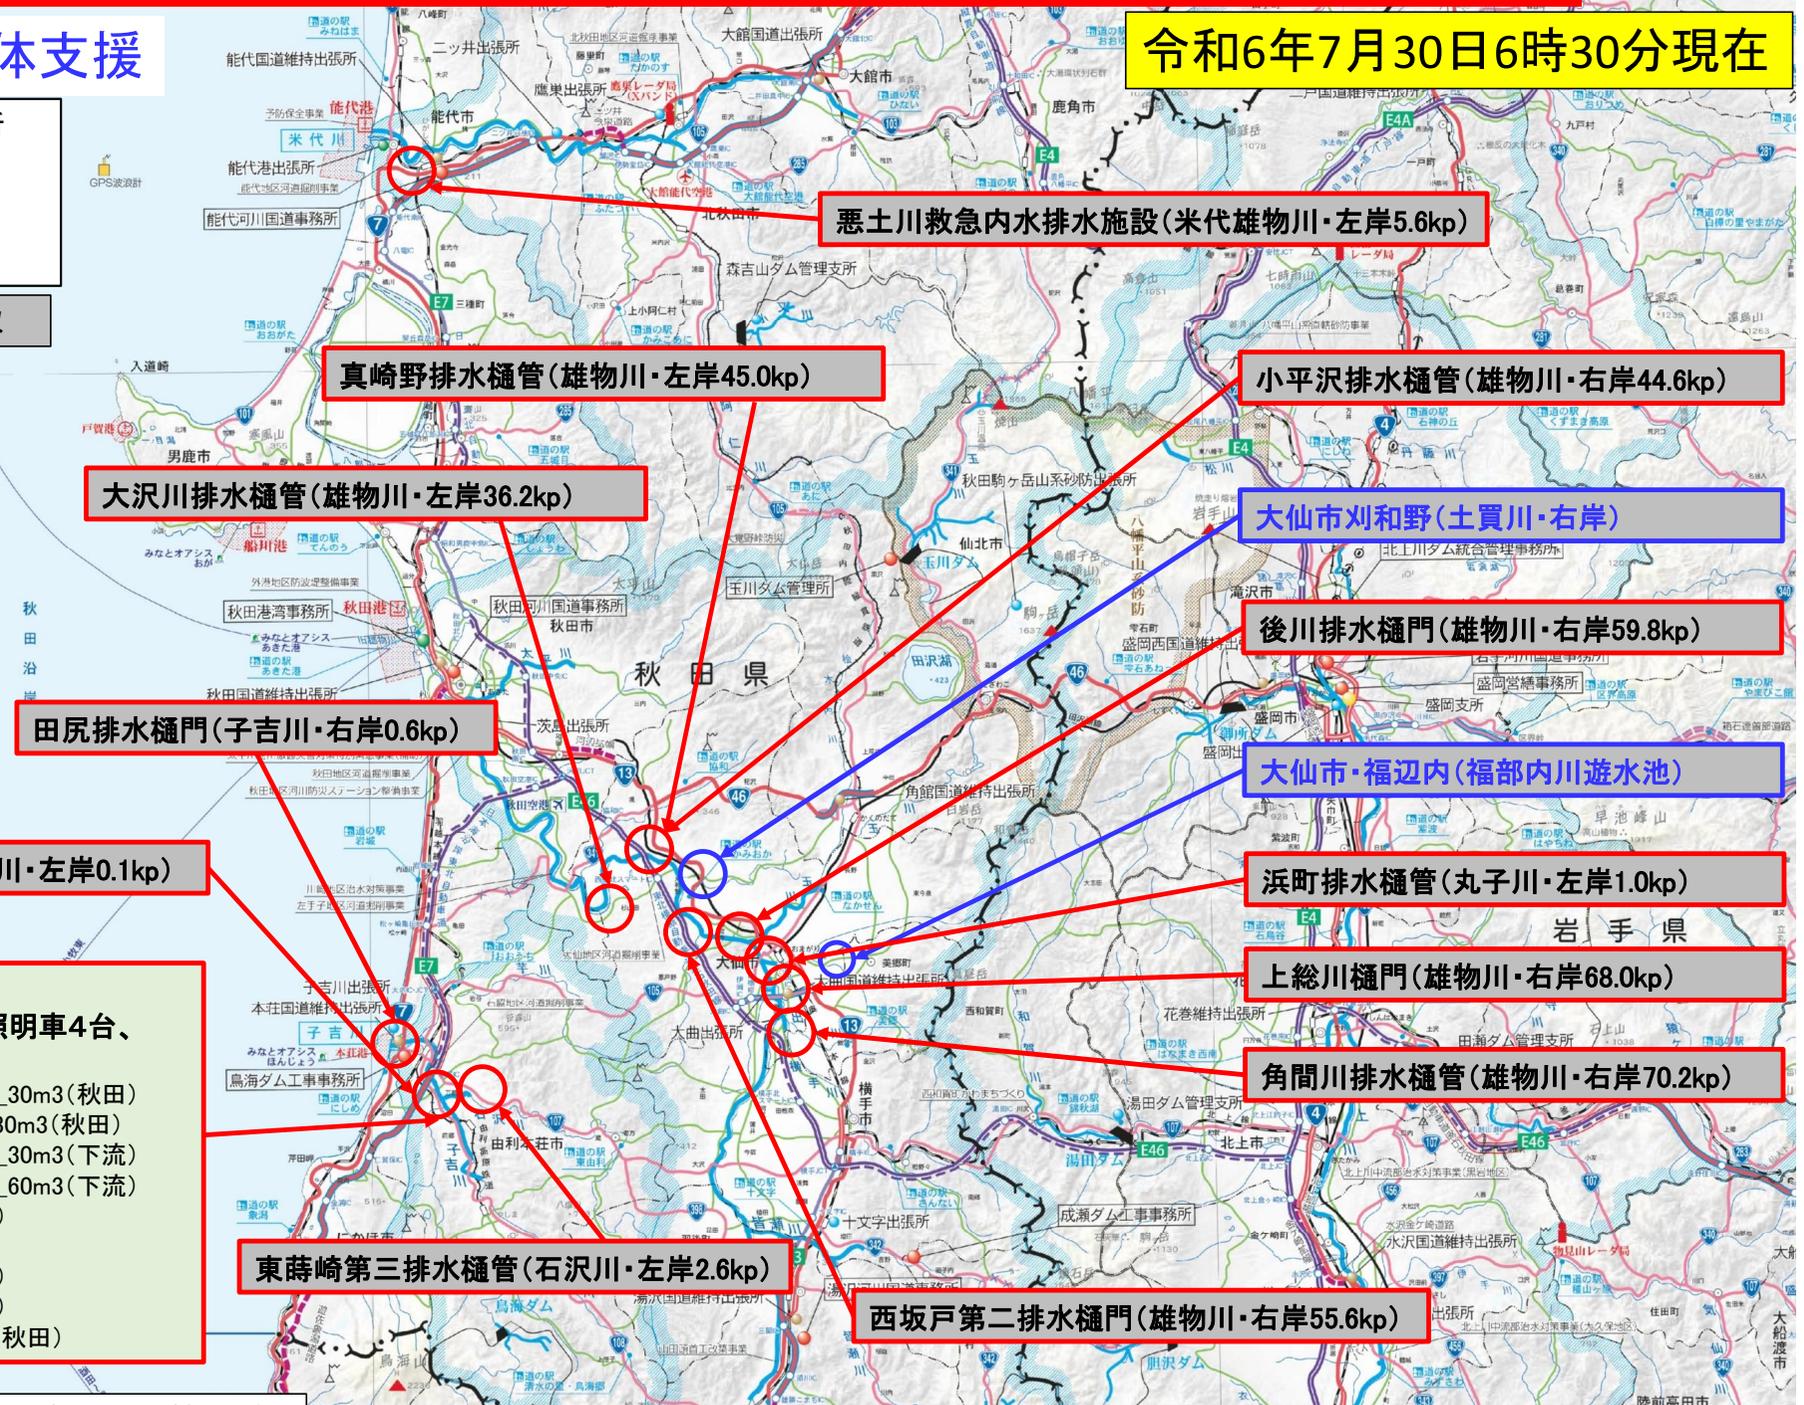

- 子吉川防災ST**
- 排水ポンプ車4台、照明車4台、待機支援車1台
- ・排水ポンプ車R02-4243_30m3(秋田)
 - ・排水ポンプ車18-4351_30m3(秋田)
 - ・排水ポンプ車R02-4242_30m3(下流)
 - ・排水ポンプ車R05-4243_60m3(下流)
 - ・照明車R05-4281(秋田)
 - ・照明車25-4281(秋田)
 - ・照明車R02-4260(下流)
 - ・照明車R02-4258(下流)
 - ・待機支援車R02-4287(秋田)

(注)速報ですので現場と相違が出る場合があります。


災害対策車稼働状況等位置図(山形)

青字は自治体支援

令和6年7月30日6時30分現在

- ・内水排除箇所 0箇所
(自治体支援箇所 0箇所)
- ・排水ポンプ車 14台
- ・照明車 5台

活動中	撤収
待機中	

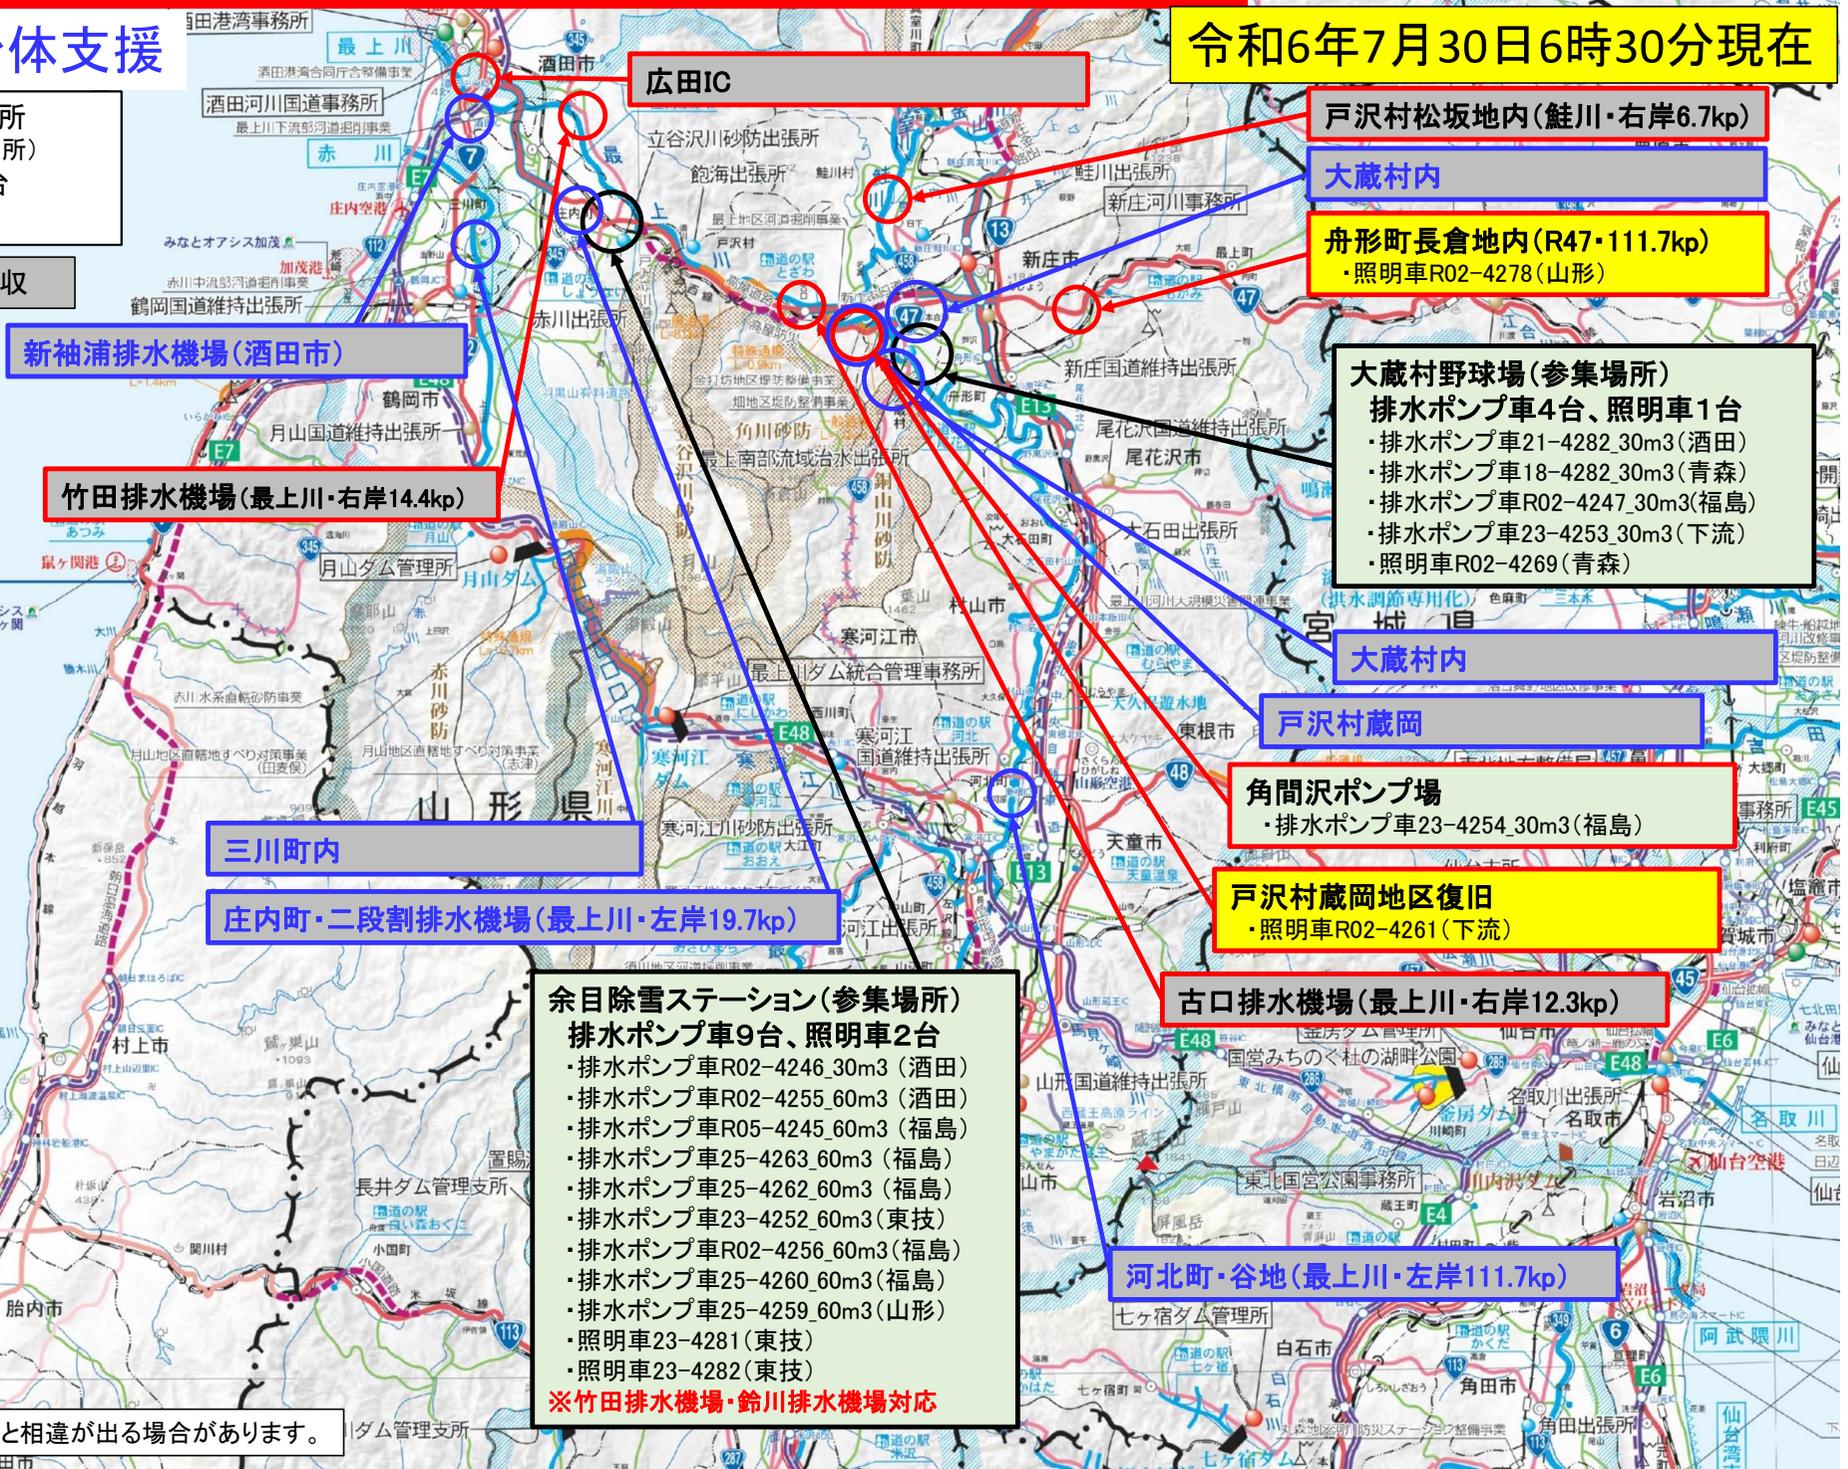

新袖浦排水機場(酒田市)

竹田排水機場(最上川・右岸14.4kp)

三川町内

庄内町・二段割排水機場(最上川・左岸19.7kp)

余目除雪ステーション(参集場所)
排水ポンプ車9台、照明車2台

- ・排水ポンプ車R02-4246_30m3(酒田)
- ・排水ポンプ車R02-4255_60m3(酒田)
- ・排水ポンプ車R05-4245_60m3(福島)
- ・排水ポンプ車25-4263_60m3(福島)
- ・排水ポンプ車25-4262_60m3(福島)
- ・排水ポンプ車23-4252_60m3(東技)
- ・排水ポンプ車R02-4256_60m3(福島)
- ・排水ポンプ車25-4260_60m3(福島)
- ・排水ポンプ車25-4259_60m3(山形)
- ・照明車23-4281(東技)
- ・照明車23-4282(東技)

※竹田排水機場・鈴川排水機場対応

戸沢村松坂地内(鮭川・右岸6.7kp)

大蔵村内

舟形町長倉地内(R47-111.7kp)
・照明車R02-4278(山形)

大蔵村野球場(参集場所)
排水ポンプ車4台、照明車1台

- ・排水ポンプ車21-4282_30m3(酒田)
- ・排水ポンプ車18-4282_30m3(青森)
- ・排水ポンプ車R02-4247_30m3(福島)
- ・排水ポンプ車23-4253_30m3(下流)
- ・照明車R02-4269(青森)

大蔵村内

戸沢村蔵岡

角間沢ポンプ場
・排水ポンプ車23-4254_30m3(福島)

戸沢村蔵岡地区復旧
・照明車R02-4261(下流)

古口排水機場(最上川・右岸12.3kp)

河北町・谷地(最上川・左岸111.7kp)

(注)速報ですので現場と相違が出る場合があります。
