


1. 国管理の子吉川水系子吉川、石沢川（秋田県由利本荘市）、最上川水系最上川（山形県新庄市、戸沢村）、鮭川（山形県戸沢村）の2水系4河川、4県（岩手県、秋田県、山形県、宮城県）管理の11水系35河川で浸水被害が発生（概ね浸水解消済み）。
2. このうち、子吉川水系子吉川、石沢川、最上川水系最上川、新田川、野尻川、米代川水系五反沢川、西目川水系西目川の計16箇所（国3箇所、秋田県8箇所、山形県5箇所）で堤防の決壊や欠損を確認。緊急応急復旧工事完了。
3. 排水機場3箇所（山形県酒田市、戸沢村）でポンプ設備の故障が発生（背後地の浸水解消済み）。1箇所では本復旧、1箇所では仮復旧完了。施設復旧までの代替として、排水ポンプ車を配備済み。
4. 2ダム（多目的ダム2）で事前放流を実施し（33ダムで事前放流の基準に達したが、31ダムは既に水位が低下していた）、32ダムで洪水調節を実施。
5. 1ダムで緊急放流（非常用洪水吐きからの越流）に移行。1ダムで特別防災操作（通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する操作）を実施。
6. 山形県管理の4ダムにて貯水池流木止め施設破損等を確認。応急対策完了。

## 秋田県内における河川の状況

### 【浸水被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川） 概ね浸水解消



県管理河川（5水系9河川） 概ね浸水解消




### 【施設被害】

国管理河川（子吉川水系子吉川、石沢川） 緊急応急復旧工事完了



県管理河川（3水系3河川） 緊急応急復旧工事完了

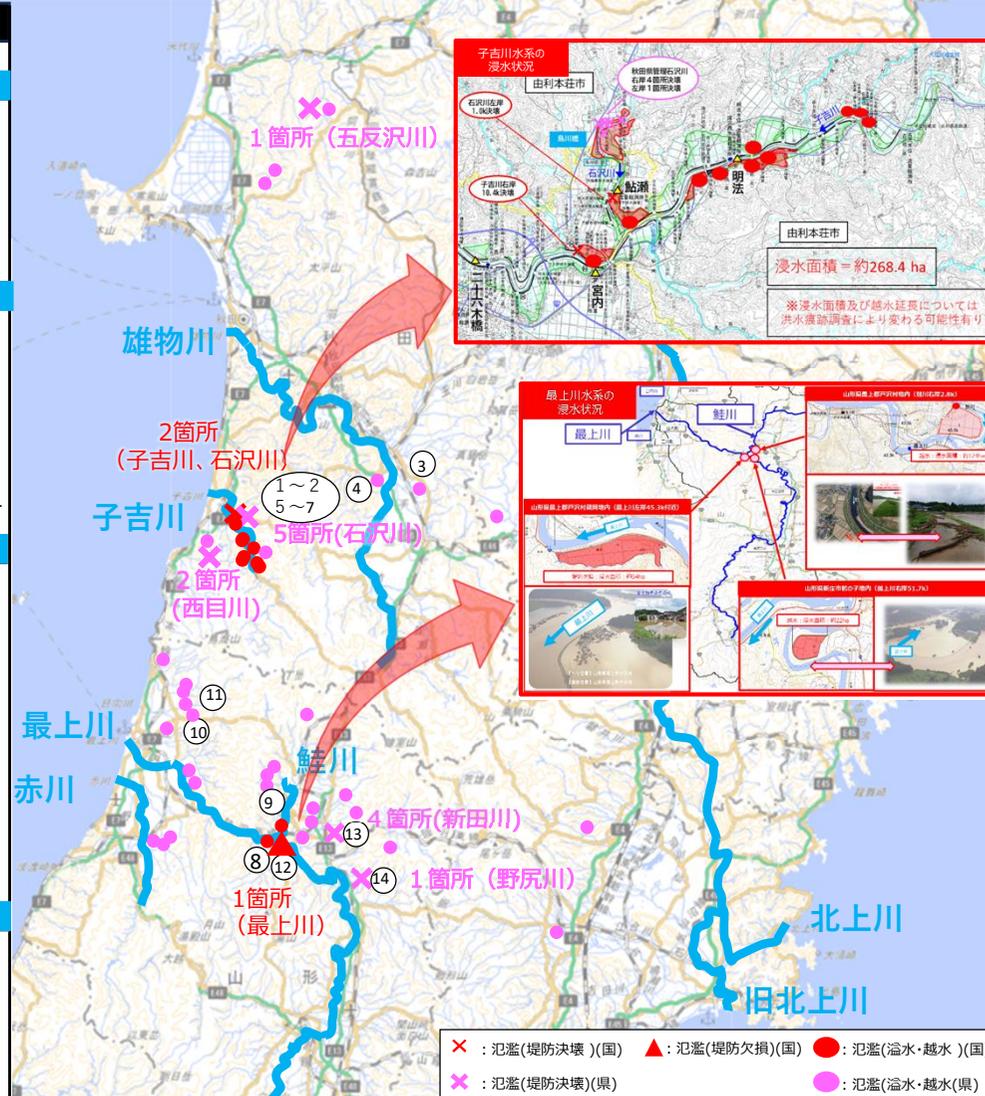

## 岩手県内における河川の状況

### 【浸水被害】

県管理河川（1水系1河川） 概ね浸水解消

## 宮城県内における河川の状況

### 【浸水被害】

県管理河川（2水2河川） 概ね浸水解消

## 山形県内における河川の状況

### 【浸水被害】

国管理河川（最上川水系最上川、鮭川） 概ね浸水解消



県管理河川（4水系23河川） 概ね浸水解消



### 【施設被害】

国管理河川（最上川水系最上川） 緊急応急復旧工事完了



県管理河川（1水系2河川） 緊急応急復旧工事完了




# 令和6年7月25日からの大雨における水道の対応状況

令和6年9月9日  
13:00時点

県	市町村	断水戸数 (戸)		断水期間	被害状況	応急給水状況	復旧対応状況	復旧見通し
		最大	現在					
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	126	0	7/26~ 8/9	河川氾濫により水道管破損	終了	仮復旧工事完了	8/9復旧済
	ゆりほんじょうし 由利本荘市	64	0	7/24~30	土砂崩れによる水道管破損	終了	仮復旧工事完了	7/30復旧済
	よこてし 横手市	20	0	7/25~29	水道管破損 (継手外れ)	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
	にかほ市	3	0	7/24~29	河川増水による添架管破損	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
山形県	さかたし 酒田市	252	0	7/25~ 9/3	橋梁落橋、道路崩落による水道管破損	終了	仮復旧工事完了	9/3復旧済
		11	0	7/25~8/1	河川増水による水管橋損傷	終了	仮復旧工事完了	8/1復旧済
		815	0	7/25~27	河川増水による水管橋損傷	終了	仮復旧工事完了	7/27復旧済
	さけがわむら 鮭川村	48	0	7/26~ 8/17	土砂崩れによる水道管破損、水源埋塞	終了	可搬式浄水施設設置 (8/15) 仮復旧工事完了	8/17復旧済
		70	0	7/26~ 8/9	河川氾濫に伴う水道管破損	終了	仮復旧工事完了	8/9復旧済
		1,014	0	7/26~29	土砂崩れによる水道管破損	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済
	まむろがわまち 真室川町	380	0	7/25~28	水源地ポンプ設備冠水 土砂崩れによる水道管破損	終了	仮復旧工事完了	7/28復旧済
とざわむら 戸沢村	2	0	7/26~29	地すべりによる水道管損傷	終了	仮復旧工事完了	7/29復旧済	
合計		2,805	0					

## ●水道施設の被災状況等

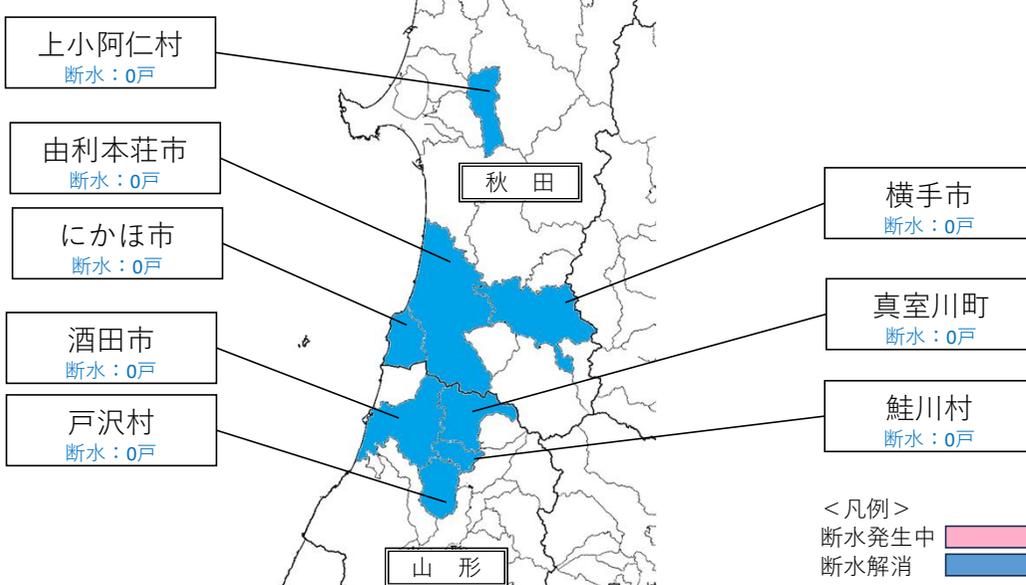

## ●被災状況等



# 【秋田県、山形県】下水道施設の被害状況等について


## ●被害のあった下水道施設

県	市町村名	施設名	被害時の状況	現在の対応状況
秋田県	かみこあにむら 上小阿仁村	マンホールポンプ 1基	浸水により異常確認	点検実施により復旧済み
山形県	さかたし 酒田市	やはた 八幡浄化センター	浸水により機能停止	仮設ポンプの設置や簡易処理の実施により機能確保済み
		まつやま 松山浄化センター	浸水により機能停止	揚水機能の復旧や簡易処理の実施により機能確保済み
	とぎわむら 戸沢村	ふるくち 古口浄化センター	浸水により機能停止	ポンプ操作盤の応急対応により機能確保済み
	ゆざまち 遊佐町	管路 (汚水)	一部破損	影響範囲は1軒 (仮設トイレにて対応) 町道や護岸の復旧にあわせて復旧予定
	しらかまち 白鷹町	マンホールポンプ 1基	落雷により機能停止	応急対応により機能確保済み
	まむろがわまち 真室川町	管路 (汚水)	一部破損	応急対応により機能確保済み
	ふながたまち 舟形町	ふながた 舟形浄化センター	ほうりゅうぎよ 放流渠の一部破損	施設内管理用道路の破損により、放流渠の一部破損 (水処理機能に影響なし)

## ●被害のあった下水道施設の位置

<凡例>

- 下水処理場 : ▲
- マンホールポンプ : ●
- 管路 : ■

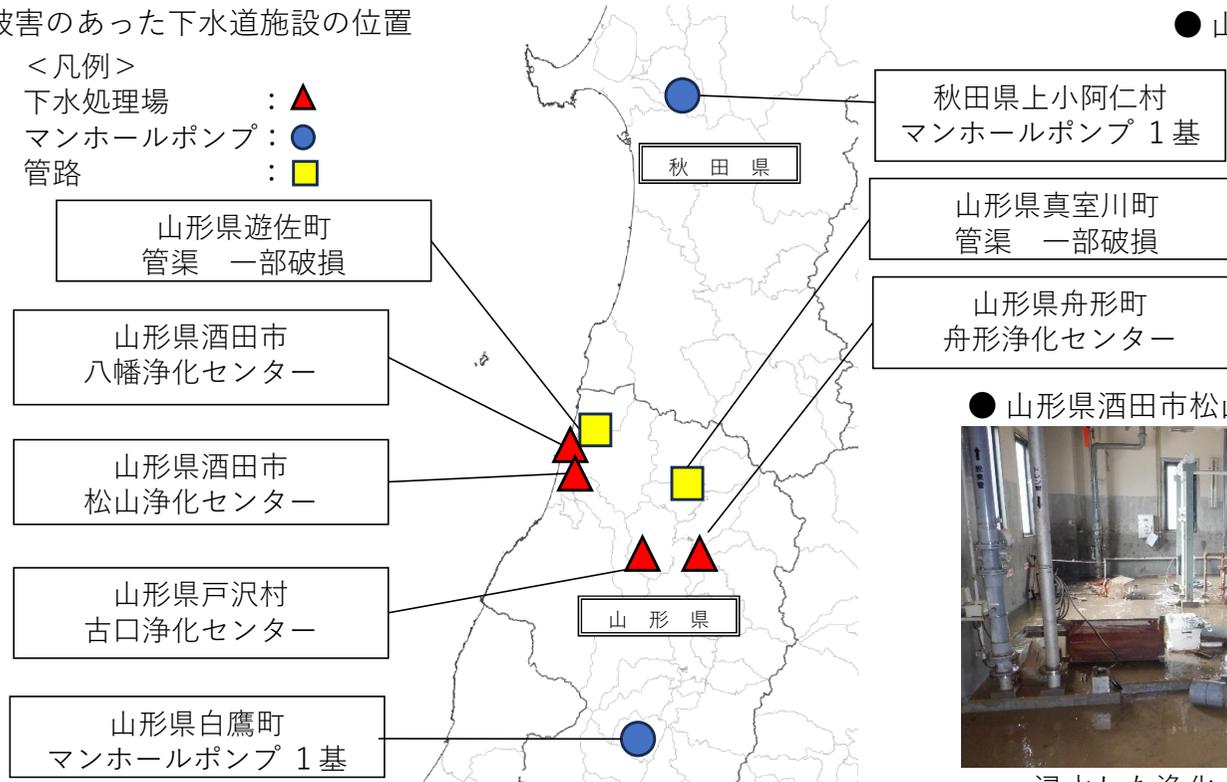

## ●山形県酒田市八幡浄化センターの被災状況と応急対応状況



浸水した曝気ブロウ

## ●山形県酒田市松山浄化センターの被災状況と応急復旧状況



浸水した浄化センター内



揚水機能の復旧確認

# 7月25日からの大雨による土砂災害発生状況

## 土砂災害発生件数

**67件**

- 土石流等 : 6件
- 地すべり : 8件
- がけ崩れ : 53件


### 【被害状況】

人的被害	: 負傷者	1名
人家被害	: 全壊	4戸
	: 半壊	1戸
	: 一部損壊	19戸

7/26

地すべり

もがみぐんさけかわむら まがりかわ  
山形県最上郡鮭川村曲川

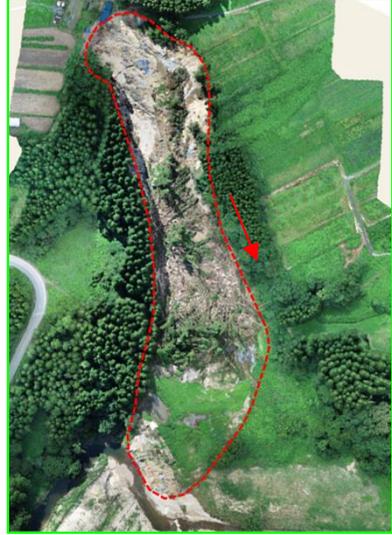

7/26

がけ崩れ

もがみぐんもがみまちせみ  
山形県最上郡最上町瀬見



7/26

がけ崩れ

もがみぐんふながたまちふながた  
山形県最上郡舟形町舟形



負傷者 : 1名  
全壊 : 1戸

7/26

土石流等


さかたし きたあおさわ  
山形県酒田市北青沢



一部損壊 : 9戸

### 発生件数内訳

山形県	57件
秋田県	6件
岩手県	2件
北海道	1件
滋賀県	1件

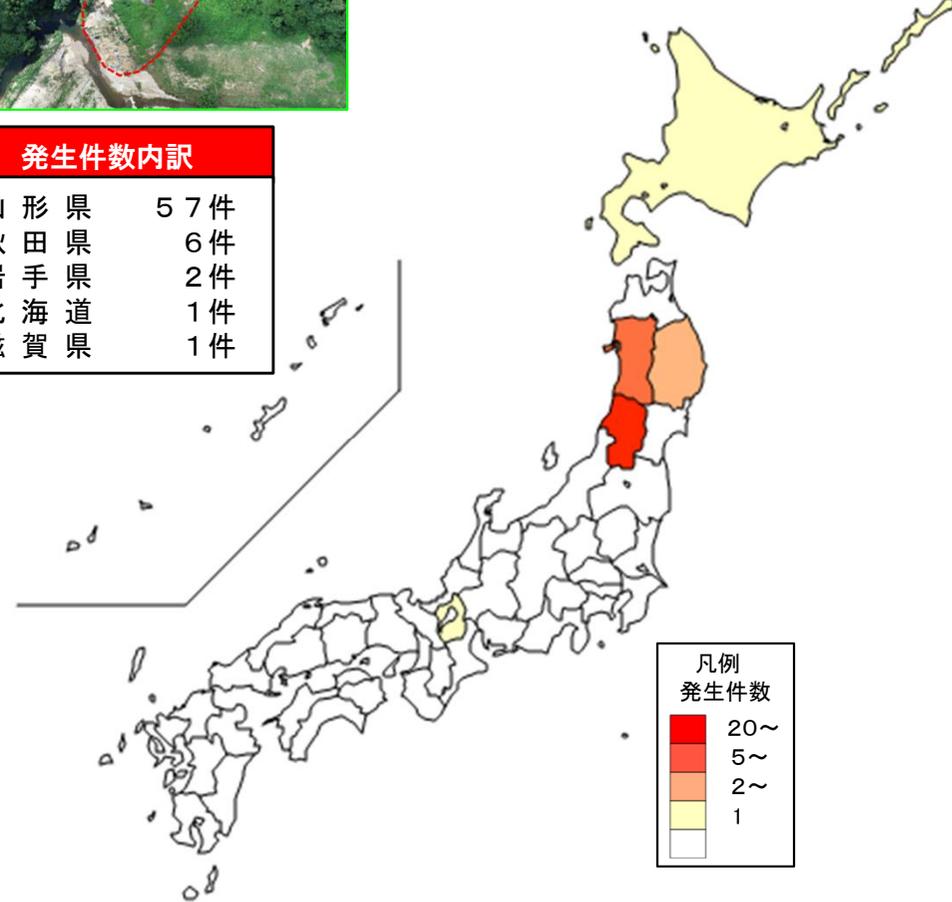

凡例  
発生件数

- 20~
- 5~
- 2~
- 1

7/26

がけ崩れ

もがみぐんさけかわむら かわぐち  
山形県最上郡鮭川村川口



全壊 : 2戸

7/26

がけ崩れ

きたあきたし あにみずなし  
秋田県北秋田市阿仁水無



半壊 : 1戸

7/25

土石流等

まいばらし いぶき  
滋賀県米原市伊吹



一部損壊 : 6戸

※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

# 7月25日からの大雨による鉄道の主な被害状況について

## ○施設被害により、秋田・山形県内の1事業者2路線で運転見合わせ中

運転見合わせ路線  
【在来線：1事業者2路線】  
・JR東日本 奥羽線、陸羽東線


**JR東日本 奥羽線**  
運休(7/25～):新庄駅～院内駅間  
運転再開時期:未定  
※ 新庄駅～院内駅間で代行バス運行中

**JR東日本 陸羽東線**  
運休(7/25～):鳴子温泉駅～新庄駅間  
運転再開時期:未定  
※ 鳴子温泉駅～新庄駅間で代行バス運行中



※写真はJR東日本提供

— : 運休区間  
— : 再開区間  
✕ : 写真の被害箇所  
× : 他の被害箇所

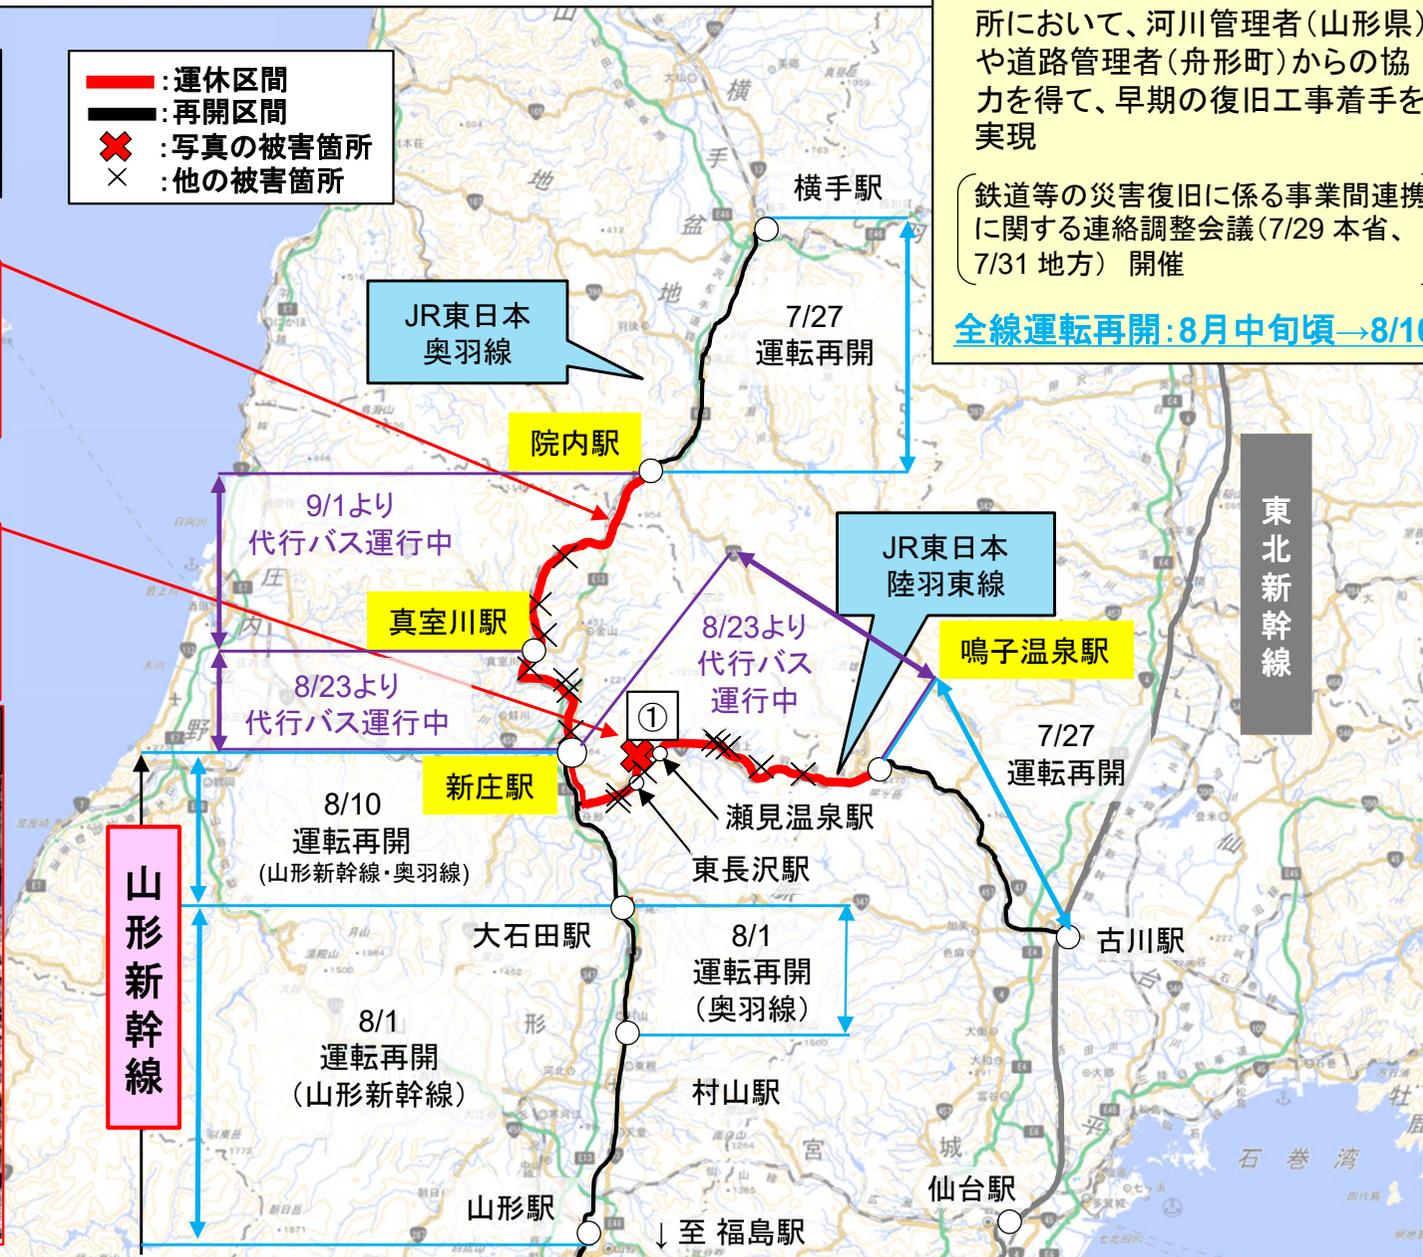

○ 山形新幹線の被災箇所のうち、特に被害の大きかった土砂流入箇所において、河川管理者(山形県)や道路管理者(舟形町)からの協力を得て、早期の復旧工事着手を実現

(鉄道等の災害復旧に係る事業間連携に関する連絡調整会議(7/29 本省、7/31 地方)開催)

全線運転再開:8月中旬頃→8/10

東北新幹線

# 【都市局】令和6年7月25日からの大雨による被災状況

**被災箇所数**  
 都市公園：10件  
 その他公園：3件  
 ※人的被害無し

にかほ  
**【施設名】仁賀保墓園**  
**【被害状況】**法面の小崩落



法面小崩落(仁賀保墓園)

まいづる  
 こいずみ  
 あらまち  
**【施設名】**舞鶴公園  
 小泉中央公園  
 荒町公園  
**【被害状況】**泥堆積  
 舗装破損等



土砂堆積(新田川河川公園)

もがみがわ  
**【施設名】**最上川下流緑地  
**【被害状況】**土砂堆積

ひがしひらた  
**【施設名】**東平田さくら公園  
**【被害状況】**法面一部崩落等



法面一部崩落(東平田さくら公園)



堆積土砂排除事業※  
 5市町村で実施中

まつやま  
**【施設名】**松山河川運動公園  
**【被害状況】**流木、ごみ堆積

もがみがわ さがえ  
**【施設名】**最上川寒河江緑地  
**【被害状況】**土砂堆積

しもがわら  
**【施設名】**下川原公園  
**【被害状況】**一部冠水

はちまん  
**【施設名】**八幡公園  
**【被害状況】**土砂流出

こったがわ  
**【施設名】**新田川河川公園  
**【被害状況】**砂堆積

もがみにし  
**【施設名】**最上西公園  
**【被害状況】**駐車場擁壁が崩落

おばなざわ  
**【施設名】**尾花沢運動公園  
**【被害状況】**地割れ、構造物に隙間



堆積土砂排除事業実施中(山形県酒田市)

※都市計画区域内及び同区域外の集落地(独立した家屋が10戸以上隣接)にて実施
